



Realisering af Gladsaxe Kommunes klimatilpasning i samspil med Nordvand

- klimakvarteret ved Høje Gladsaxe



KTC årsmøde 2015
Philip Hartmann
Teknisk direktør
By- og Miljøforvaltningen
Gladsaxe Kommune



Projektets start...


Problemer

- Overløb til Fæstningskanalen
- Generelle problemer med oversvømmelser i oplandet

De første planer

- Udvidelse af Gyngemosebassinet

Kan vi finde 4000 m³ på andre måder?

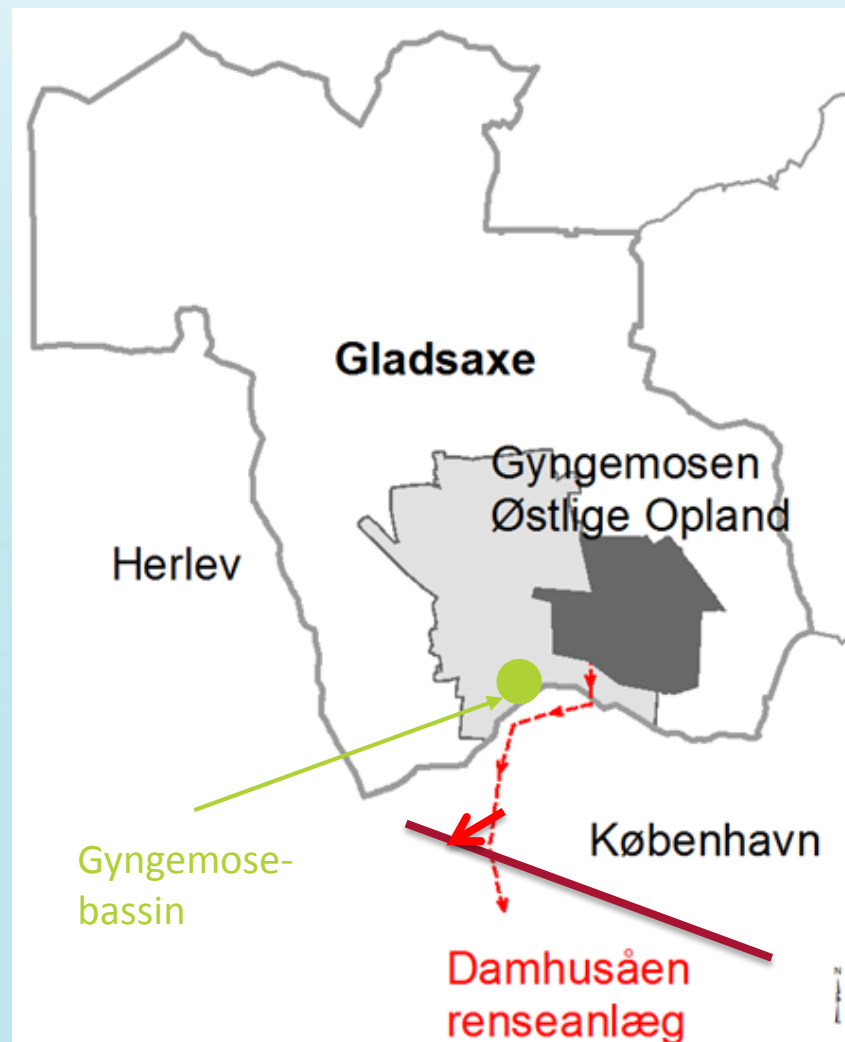



.. i dag: Høje Gladsaxe klimakvarter

- Et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, 142 ha
- Overløb og oversvømmelser er reduceret markant
- Samtidig løftet andre kommunale dagsordner
- Et nyt blå/grønt byområde, bundet sammen af klimatilpasningsprojekterne





Idrætsanlæggene i Gladsaxe

- Opsamling og forsinkelse
- Merværdi: Nedsænkede crossfit-områder, paddletennisbane, hoppepude, baner til løbehjul, legeområder med vandkunst med mere
- Klimatilpasningsløsningerne åbner Sportscentret for nye uformelle aktiviteter - til nye målgrupper
- VANDPLUS har støttet projektet





Vandledningsstien

- Rekreative bassiner med forskelligt udseende
- Merværdi: Renoveret cykelsti, forlænget med en ny cykeltunnel med forbindelse til supercykelsti
- Sikker skolevej





Boligafdelingen Marielyst

- 560 husstande håndterer regnvandet lokalt
- Regnbede, grøfter, render, grønne veje
- Merværdi: Tidligere store flader med brugsgræs – nu små grønne oaser





Høje Gladsaxe Park

- Fredet naturområde, modtager vand fra de øvrige projekter
- Renser og forsinker regnvandet før det ledes ud i moseområder
- Merværdi: 3 nye regnvands-søer og et nyt vandløb
- Nye levesteder for spidssnuet frø og stor vandsalamander





Hvad har vi lært?

- Ikke komme med færdige løsninger
- Grib mulighederne i et område
- Dialog og samarbejde med den enkelte grundejer fra start
- Processer tager tid
- Kræver et højt niveau af koordination





Fokus for det gode samarbejde mellem kommune og forsyning

- God dialog og tillid er grundlag for, at den type projekter kan lade sig gøre
- Alle har set projekterne som et hele – bolde er ikke blevet ”tørret af”
- Kræver fleksibilitet og nytænkning fra myndighedens side. Det er ikke traditionelle løsninger, hvor vi kan dokumentere alt fra start
- Kommunen skal forstå forsyningens grundlag og spilleregler – fleksibilitet i den praktiske planlægning
- Nordvand skal forstå politiske ønsker og ambitioner – for Gladsaxe er det vigtigt med merværdien i projekterne



Danmarks Friluftskommune 2015



DANMARKS
FRILUFTSKOMMUNE





Spørgsmål?

